



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL

ANEXO III

2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PERÍODO DE 10/02/2020 A 20/06/2020

**ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SECRETARIA DO
TRABALHO, EMPREG, RENDA E ESPORTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO BAIANO DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL E SÓCIO PRODUTIVO – ECOBAHIA
INSTRUMENTO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2019**

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Informações da Parceria	3
3.	Dados da Organização da Sociedade Civil - OSC	4
4.	Perfil da Atividade ou Projeto	4
5.	Resultados das Técnicas Utilizadas no Monitoramento e Avaliação	5
6.	Cumprimento de Cláusulas da Parceria	11
7.	Cumprimento da Contrapartida	11
8.	Transparência	12
9.	Recomendações	12
10.	Conclusão	12
11.	Anexo	12

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 11/02/2020 a 20/06/2020, tem como objetivo apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades pactuadas no Termo de Colaboração nº. 013/2019, celebrado entre o Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Socioprodutivo - ECOBHAIA e esta Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é o (a) servidor (a) Dayvid Souza Santos designado (a) para desempenhar a função de Gestor da Parceria, através da Portaria nº 063, de 10/06/2019.

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria nº062, de 10/06/2019, composta pelos seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos, Anelize Barbosa dos Santos e Karla Uckonn Oliveira, é a responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e homologar este Relatório.

2. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Instrumento da Parceria:	Termo de Colaboração 013/2019
Objeto da Parceria:	Gerir o Centro Vocacional Tecnológico Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do Cacau, visando promover a melhoria socioeconômica e ambiental da cadeia produtiva do cacau.
Vigência:	17/06/2019 a 16/06/2020

Valor Total da Parceria:				
Nº da Parcela	Repassse Previsto		Repassse Realizado	
	Data	Valor	Data	Valor
01	Jun/2019	R\$127.768,17	Jul/2019	R\$127.768,17
02	Set/2019	R\$319.420,44	Jun/2020	R\$105.000,00
03	Dez/2019	R\$191.652,24	-	-
04				
TOTAL	-	R\$ 638.840,85	-	R\$232.768,17

Alterações da Parceria			
Instrumento	Objeto	Vigência	Valor Total
Apostila nº 10/2020	Reti-ratificar, com efeitos a partir da sua data de assinatura, as disposições contidas nos itens 05 (resumo das metas e atividades) e 08 (Cronograma de Desembolso e Composição das Parcelas do Plano de Trabalho.	17/06/2019 a 16/06/2020	R\$ 1.015.600,00

3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC

Nome da OSC: Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo – ECOBAHIA
CNPJ:09.385.474/0001-73
Representante: Adi Lira de Sousa
Telefone de Contato:(73) 98104-4616
E-mail: ecobahia.paubrasil@gmail.com / adi.lira01@gmail.com

4. PERFIL DA ATIVIDADE OU PROJETO

O Centro Vocacional Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do Cacau tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do cacau, através de pesquisas e de profissionalização, voltados para a difusão do acesso e transferência de conhecimentos tecnológicos e práticos na área do manejo e do processo produtivo do cacau. Dessa forma, o CVT Cacau estará direcionado para capacitação tecnológica e prática da população bem como, de investigação da realidade, formação profissional básica e prestação de serviços especializados, promovendo a melhoria dos processos para a ampliação de renda das famílias público beneficiário do projeto.

A proposta apresentada pela OSC Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo - ECOBAHIA atesta sua capacidade técnica e operacional na implementação de unidades produtivas de cacau agroecológico com inovação tecnológica de produção sobre floresta no Território Litoral Sul, além de atuar em conjunto com os movimentos sociais no desenvolvimento de práticas e intervenções agroecológicas.

Vislumbra-se do Estatuto da OSC a implantação de programas e desenvolvimento de ações comunitárias, através de pesquisas e projetos, assistência técnica e extensão rural quem contemplem os aspectos de saúde, cultura, desporto, educação, combate a pobreza, segurança alimentar e nutricional, agricultura, economia, meio ambiente, bem como implantar programas e desenvolver ações comunitárias com povos e comunidades tradicionais do meio urbano e rural como (ciganos, ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de bagaço, pescadores artesanais, comunidades indígenas, extrativistas, remanescentes de quilombos e de terreiros), minimizando as diferenças sociais inerentes ao ser humano enfocando o pleno exercício da cidadania.

Portanto, verifica-se uma alta identidade e reciprocidade de interesse da SETRE com os da OSC Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo - ECOBAHIA no que diz respeito ao que foi escrito na proposta de trabalho, isto nos faz ter uma orientação que buscará pavimentar um caminho onde se possa ter uma realização da proposta de trabalho, em mútua cooperação, a partir da parceria que está sendo formalizada.

5. RESULTADOS DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, procedeu-se a aplicação das seguintes técnicas:

5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

O Termo de Colaboração 013/2019, encontra-se em seu primeiro ano de vigência, não tendo realizado a pesquisa de satisfação obrigatória anual, até o momento da construção do presente relatório. Atentamos que a pesquisa deverá ser realizada obrigatoriamente, de acordo com normativa, em vigências superiores a um ano, o que não se aplica ao presente Termo de Colaboração.

5.2 VISITA TÉCNICA IN LOCO

Não houve visita in loco em decorrência da pandemia da Covid-19.

5.3 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.

a) Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:

Planejamento do Projeto / Atividade		Indicador	Unid.	Meio de Verificação	Qtde. Meta (Ano I)														
					Mês 1			Mês 2			Mês 3			Mês 4			FINAL		
					P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%	P	R	%
OBJETIVO DA PARCERIA	Gerir o Centro Vocacional Tecnológico Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do Cacau, visando promover a melhoria socioeconômica e ambiental da cadeia produtiva do cacau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÇÃO	A1 Implantação de sistema de governança do CVT cadeia produtiva do cacau e chocolate.	Indicador 1: Sistema de Governança implementado e funcionando	Und	Relatórios e listas de presença das reuniões do Grupo Gestor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
	A2 Instalação da estrutura de apoio.	Indicador 2: Estruturação do centro de apoio	Und	Relatórios com fotografias do andamento da adequação da estrutura física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
	A3 Composição de equipe técnica e administrativa	Indicador 3: Equipe técnica e administrativa selecionada e efetivada	Und	Contracheques	-	-	-	3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	9	9	100%

A4	Execução de ações decapacitação	Indicador 4: Pelo menos, 2 temas de capacitações realizados	Und	Relatórios com fotografias, lista de presença	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A5	Execução de ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva do cacau e chocolate no Território de Identidade Litoral Sul.	Indicador 5: Ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva do cacau	Und	Relatórios com fotografias, filmagens, lista de presença e material gráfico produzido	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	100%	5	5	100%	
A6	Produção de material pedagógico e de divulgação	Indicador 6: Material pedagógico e de divulgação produzidos	Und	Cópias dos materiais produzidos	-	-	-	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	3	3	100%
Desempenho por período					-			100%			100%			100%			100%		
Desempenho da parceria					100%														

Legenda: P = Previsto; R = Realizado

b) Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:

A seguir apresentam-se os resultados por indicador estabelecido no Plano de Trabalho:

Ação 1 – Implantação de sistema de governança do CVT cadeia produtiva do cacau e chocolate.

Indicador nº 1: Sistema de Governança implementado e funcionando

Estava prevista para o período, a realização de 1 reunião para apresentação do projeto e composição do comitê gestor. Conforme relatado pela OSC, as instituições do território com atuação em temáticas relevantes ao objeto do projeto foram convidadas formalmente.

O encontro aconteceu no dia 09/10/2019 na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) - rodovia Ilhéus/Itabuna, no Pavilhão Pedro Calmon, corredor do Curso de Economia, sala 1111. Ao todo, compareceram 32 pessoas, entre representantes entre representantes de Órgãos Públicos (CEPLAC, Universidade Federal do Sul da Bahia; Instituto Federal da Bahia); Gestores de OSC'S.

De acordo com relatório, a apresentação contou com a participação de toda equipe técnica do CVT formada pelos seguintes integrantes: João Carlos de Pádua Andrade (Coordenador Geral), Andrey de Almeida Fontes (Coordenador Territorial), Eliene Carmo da Rocha (Técnica Administrativa), Adi Lira de Souza (Coordenador Geral do Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo- ECOBAHIA). Contou também com a presença dos representantes das instituições parceiras e da Emissora de Jornalismo de televisão TV Record. Após o encontro, foi firmado um Termo de Parceria, formalizando a constituição do Comitê Gestor do projeto.

Esta ação foi comprovada por meio de relatório descritivo, lista de presença, registros fotográficos e Termo de Parceria firmado entre as instituições.

Ação 2 – Instalação da estrutura de apoio.

Indicador nº 2: Estruturação do centro de apoio

Para realização desta ação, foram realizadas visitas institucionais de reconhecimento do território, envolvendo a SETRE, o Instituto Ecobahia e a UESC. Foi realizada a licitação, tendo como vencedora a empresa Cajazeira Construtora Ltda. As obras foram iniciadas, tendo concluído 100% do total da obra, dentro do período deste relatório. De acordo com relatório de andamento da obra, foram realizados serviços preliminares, placa de obra e instalação; capina e limpeza manual do terreno, inclusive remoção de árvores com auxílio de máquina; fundação, locação convencional, escavação e concreto armado; paredes e painéis e alvenaria de vedação (parcial). O ato inaugural desta obra, e conseqüentemente a conclusão da ação, foi amplamente divulgado em mídia impressa, virtual e televisiva

Esta ação foi comprovada por meio de: Relatórios de andamento da obra, registros fotográficos e registros do processo licitatório.

Ação 3 – Composição de equipe técnica e administrativa

Indicador nº 3: Equipe técnica e administrativa selecionada e efetivada

A equipe técnica do projeto prevista para o período foi parcialmente contratada: 01 coordenador geral (contrapartida), 01 coordenador territorial e 01 assistente administrativo.

A realização parcial desta ação foi comprovada por meio de: Contracheques assinados e relatórios assinados pela equipe contratada.

Ação 4 – Execução de ações de capacitação

Indicador nº 4: Pelo menos, 2 temas de capacitações realizados

Esta ação não foi executada, pois não houve repasse para a execução da mesma, nesse caso não existe a devolução de valores referentes a essa ação.

Ação 5 – Execução de ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva do cacau e chocolate no Território de Identidade Litoral Sul.

Indicador nº 5: Ações para desenvolvimento tecnológico na cadeia produtiva do cacau

Foram realizadas cinco pesquisas, com foco no território, voltadas para a utilização do cacau e chocolate de forma que fortaleçam a produção trazendo uma variedade de produtos para a cadeia produtiva. Conforme os documentos anexados a prestação de contas com o conteúdo da pesquisa na íntegra. As pesquisas são: Manteiga de cacau: fusão de sabores; Redescobrimo o mel do cacau; Nibs de cacau: redescobrimo o potencial; Ouro negro: mais cacau em sua mesa; Cerveja e cacau: blends para novas cervejas.

Ação 6 – Produção de material pedagógico e de divulgação

Indicador nº 6: Material pedagógico e de divulgação produzidos

As ações referentes a essa meta foram comprovadas através de relatórios financeiros contendo as notas fiscais, tomadas de preços, recibos de pagamentos, certidões e ordem bancária.

c) Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período:

O projeto encontra-se em funcionamento de sua estrutura, contamos que existe uma forte articulação com instituições territorial e com a Universidade Estadual de Santa Cruz, oferecendo um ambiente favorável ao desenvolvimento de ações de desenvolvimento tecnológico, ancoradas nas especificidades do contexto local.

A manutenção e continuidade estrutura física representa um grande desafio, na medida em que envolve a necessidade de diálogo constante com a Universidade. Neste ponto, o Instituto Ecobahia tem demonstrado habilidade no manejo desta parceria.

d) Outras informações:

- Relação de bens adquiridos pela SETRE e repassados ao Instituto Ecobahia, de acordo com o Plano de Trabalho, item 7.2 –A. Bens e Materiais repassados pela SETRE para execução da parceria.

Item	Descrição	Nº Patrimônio	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total dos Bens	Nota Fiscal
001	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002512	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
002	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002513	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
003	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002514	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
004	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002515	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
005	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002516	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
006	Cadeiras fixa sem braço em couro	Y000002517	1	R\$ 169,64	R\$ 169,64	002.244
007	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002518	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
008	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002519	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
009	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002520	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
010	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002521	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
011	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002522	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
012	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002523	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
013	Mesa de trabalho 1000x600	Y000002524	1	R\$ 178,86	R\$ 178,86	002.244
014	Armário alto em aço duas portas cinza	Y000002525	1	R\$ 475,06	R\$ 475,06	002.173
015	Armário alto em aço duas portas cinza	Y000002526	1	R\$ 475,06	R\$ 475,06	002.173
016	Gaveteiro c/ 3 gavetas e chave	Y000002527	1	R\$ 247,53	R\$ 247,53	015.909
017	Gaveteiro c/ 3 gavetas e chave	Y000002528	1	R\$ 247,53	R\$ 247,53	015.909
018	Ventilador de teto c/ luminária	Y000002529	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.604
019	Telefone sem fio	Y000002530	1	R\$ 103,33	R\$ 103,33	02.272
020	Bebedouro	Y000002531	1	R\$ 542,85	R\$ 542,85	0.696
021	Balança mecânica	Y000002532	1	R\$ 998,80	R\$ 998,80	01.378
022	Ar condicionado	Y000002533	1	R\$ 2.414,99	R\$ 2.414,99	02.278
023	Estante em aço cinza com seis pretelairas	Y000002534	1	R\$ 120,93	R\$ 120,93	002.173
024	Cadeiras giratórias	Y000002501	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
025	Cadeiras giratórias	Y000002502	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
026	Cadeiras giratórias	Y000002503	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
027	Cadeiras giratórias	Y000002504	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
028	Cadeiras giratórias	Y000002505	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569

Item	Descrição	Nº Patrimônio	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total dos Bens	Nota Fiscal
029	Cadeiras giratórias	Y000002506	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
030	Cadeiras giratórias	Y000002507	1	R\$ 196,50	R\$ 196,50	001.569
031	Arquivos de Aço c/ 04 gavetas	Y000002508	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00	001.568
032	Arquivos de Aço c/ 04 gavetas	Y000002509	1	R\$ 370,00	R\$ 370,00	001.568
033	Mesa auxiliar	Y000002510	1	R\$ 190,50	R\$ 190,50	001.580
034	Mesa de reunião	Y000002511	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00	001.579

5.3.2 Análise dos Documentos Comprobatórios das Despesas

Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução Financeira da parceria com base na Lei nº. 13.019/2014 e Decreto nº. 17.091/2016.

Tratando-se do monitoramento e avaliação técnica, foi identificado o nexo de causalidade nos relatórios de sistematização das atividades, relatório de prestação de contas **final**, listas de presença e registros fotográficos, com os documentos comprobatórios das despesas realizadas, são essas notas fiscais, recibos, guias de recolhimento de impostos e contribuições, contracheques, contratos de trabalho, orçamentos e extratos bancários. As despesas realizadas se correlacionam com as atividades no que diz respeito aos períodos de realização, quantidade e especificidades dos produtos. É importante destacar que a ação 4 não foi executada devido ao não repasse da parcela referente a essa ação. Isso se deu em consequência do atraso da ECOBAHIA na contratação da obra de construção do CVT- Cacau, fato este que atrasou toda execução do cronograma do plano de trabalho.

Cabe ressaltar que os aspectos técnicos financeiros, em sequência, passaram pela análise da Coordenação financeira, que avaliou a conformidade dos documentos e o cumprimento das normas pertinentes.

6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA

Após análise dos documentos referentes à prestação de contas **final**, foi constatado que o desenvolvimento do projeto pela instituição se encontrou em conformidade com as condições estabelecidas nas cláusulas do Termo de Colaboração.

Passa-se à análise:

- CLAUSULA SÉTIMA: Em conformidade. As obrigações da Administração Pública e da OSC, no limite das atribuições da análise técnica, foram executadas conforme o disposto na cláusula.

- CLAUSULA DÉCIMA: Em conformidade. A Comissão de Monitoramento e Avaliação acompanhou e fiscalizou as atividades do projeto, inclusive com visitas técnicas in loco, com total liberdade para observação e orientação.

7. CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA

A OSC executou a contrapartida em bens e serviço, conforme acordado, para o período, por meio da disponibilização de Coordenador Geral por 10 horas semanais durante o período de análise deste relatório, sendo utilizado como referência para cálculo o valor de R\$ 15,00/hora.

8. TRANSPARÊNCIA

De acordo com o art. 11 da Lei nº 13.019/2014, a OSC vem divulgando na internet e em locais visíveis de suas redes sociais, as ações realizadas. É mantida uma comissão de gestão, composta por diversas instituições locais, que tem entre suas responsabilidades, a de monitoramento da execução do projeto. Esta comissão foi formada e encontra-se atuante.

9. RECOMENDAÇÕES

Conforme descrito nos relatórios anteriores a OSC apresentou atraso na execução das ações planejadas, sendo o principal atraso na contratação da obra de construção do CVT-Cacau, desta forma, o cronograma de execução foi comprometido e com isso não houve o cumprimento da ação 4. Ressalto que não houve repasse financeiro para a execução dessa meta, por consequência não haverá devolução de valores.

10. CONCLUSÃO

De acordo com os relatórios parciais e o final de prestação de contas encaminhado pelo Instituto Ecobahia à SETRE, as ações previstas foram cumpridas, não sendo executadas apenas as ações que não receberam repasses para execução. A taxa de execução física do Termo de Colaboração é de 100% e de execução financeira de 100%.

11. ANEXO

I – Parecer Técnico de Análise da Prestação de Contas

Salvador, 11 de janeiro de 2021.

Dayvid Souza Santos
Coordenador da COFD

Termo de Colaboração Nº 013/2019

CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DO CACAU E
CHOCOLATE CVT

RELATÓRIOS

TERRITÓRIO LITORAL SUL, 2020



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,
RENDA E ESPORTE.
Superintendência de Economia Solidária - SESOL
Coordenação de Formação e Divulgação - COFD



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



MINISTÉRIO DA
TRABALHO, EMPREGO,
RENDA E ESPORTE



Termo de Colaboração N° 013/2019

CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DO CACAU E
CHOCOLATE CVT

RELATÓRIO

Acompanhamento

TERRITÓRIO LITORAL SUL, 2020





ATIVIDADE: 2.1 Relatório Andamento da Obra/CVT

FACILITADOR (A): ECOBAHIA

DATA:06/08/2020

TERRITÓRIO: LITORAL SUL

CIDADE: ILHÉUS/BA

LOCAL DA ATIVIDADE: UESC

META:2 ETAPA:2.1

FORMULÁRIO DE SISTEMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

1. RELATÓRIO DESCRITIVO DA ATIVIDADE

Ilhéus, 06/08/2020.

Ocorreu um encontro entre os representantes da Empreiteira que é responsável pela reforma e ampliação do espaço onde será implementado o CVT Cacau, Adi Lira (Ecobahia), Jorge representante da Prefeitura da UESC. Neste encontro detalhes sobre o desenrolar para a finalização e entrega da obra começaram a ser definidos e são relatados abaixo:

- Que a obra está quase toda concluída, ficando assim para Universidade o compromisso de instalar a rede elétrica momentânea para o ato de inauguração. A empresa já fez toda ligação interna do prédio.
- Durante o processo de conclusão da obra, a empresa dará agilidade para poder entregar a obra pronta no dia deste mês. A Empreiteira já está procurando profissionais para acelerar a execução.
- Haverá necessidade de fazer uma limpeza geral ao entorno da obra para entregar.
- Sobre a instalação de rede de baixa tensão. Ficou acertado com Jorge (Responsável pela Prefeitura do Campus da UESC), a avaliação de a

mesma rede da fábrica de ração poder atender a fábrica de chocolate. A fábrica de ração já está com obra concluída e aguarda a instalação elétrica. Adi se dispôs auxiliar no que possível para viabilização deste processo.

2. Número de Participantes:

04 Participantes

3. Caracterização dos Participantes:

Gestores de OSC'S, Representantes da Empreiteira responsável pela obra.

4. Problematizações e Deliberações:

Conclusão da obra, limpeza dos arredores, ligação da rede elétrica

5. Pelo Menos cinco fotos publicáveis:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE
Superintendência de Economia Solidária - SESOL
Coordenação de Formação e Divulgação - COFD



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



MINISTÉRIO DA
TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE
Superintendência de Economia Solidária - SESOL
Coordenação de Formação e Diferenciação - COFD



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



MINISTÉRIO DA
TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE.
Superintendência de Economia Solidária - SESOL
Coordenação de Formação e Divulgação - CDFD



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIAS, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



MINISTÉRIO DA
TRABALHO, EMPREGO,
RENDIA E ESPORTE





Andrey de Almeida Fontes
Andrey de Almeida Fontes

Coordenador Territorial Cacau/Chocolate

Termo de Colaboração N° 013/2019

CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DO CACAU E
CHOCOLATE CVT

RELATÓRIO

REFORMA E APLIAÇÃO

TERRITÓRIO LITORAL SUL, 2020



Obra: Reforma da unidade de processamento de chocolate simplificada CVT Cacau.
Contratante: Instituto Baiano de desenvolvimento ambiental e sócio produtivo – ECOBAHIA.
Ordem de Serviços: 27/11/2019
Início dos Serviços: 29/11/2019
ART n°.: BA20200253302
Contrato n°.: 001/2019

RELATÓRIO FINAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Este relatório técnico tem por objetivo informar ao cliente todo o andamento dos serviços ocorridos no período, e assim realizar o devido acompanhamento da execução conforme o cronograma físico.

Data	Descrição
05/12/19 à 30/08/ 2020	<ul style="list-style-type: none">• Estrutura: Concreto Armado, laje pré moldada com escoramento e ferragens;• Paredes e painéis: Conclusão de alvenaria de vedação, Divisória em madeira compensada;• Revestimento: Chapisco, reboco e revestimento cerâmico;• Cobertura: Estrutura metálica, cobertura com telha trapezoidal;• Esquadrias: Portas em madeira de 0,70, 0,80 e 0,90, porta em alumínio, basculante e cobogo em concreto;• Pisos: Contrapiso em concreto, revestimento cerâmico, piso em concreto;• Forro Pvc com estrutura de fixação;• Pintura: Tinta Látex e tinta Esmalte;• Instalações Hidrossanitários: Lavatório, tubos, conexões, registros, Bacia sanitária, bancada em granito, caixa de concreto pré moldado, fossa séptica, reservatório de água, sumidouro, caixa de gordura;• Instalações elétricas: Caixa de proteção, tubos eletrodutos e conexões, fios e cabos, aterramento, tomadas, interruptores, disjuntores, quadro de distribuição, luminárias.• Limpeza final.
FOTOGRAFIAS DOS SERVIÇOS:	
<ul style="list-style-type: none">• Estrutura: Concreto Armado, laje pré moldada com escoramento e ferragens;• Paredes e painéis: Conclusão de alvenaria de vedação, Divisória em madeira compensada.	







- Revestimento: Chapisco, reboco e revestimento cerâmico;






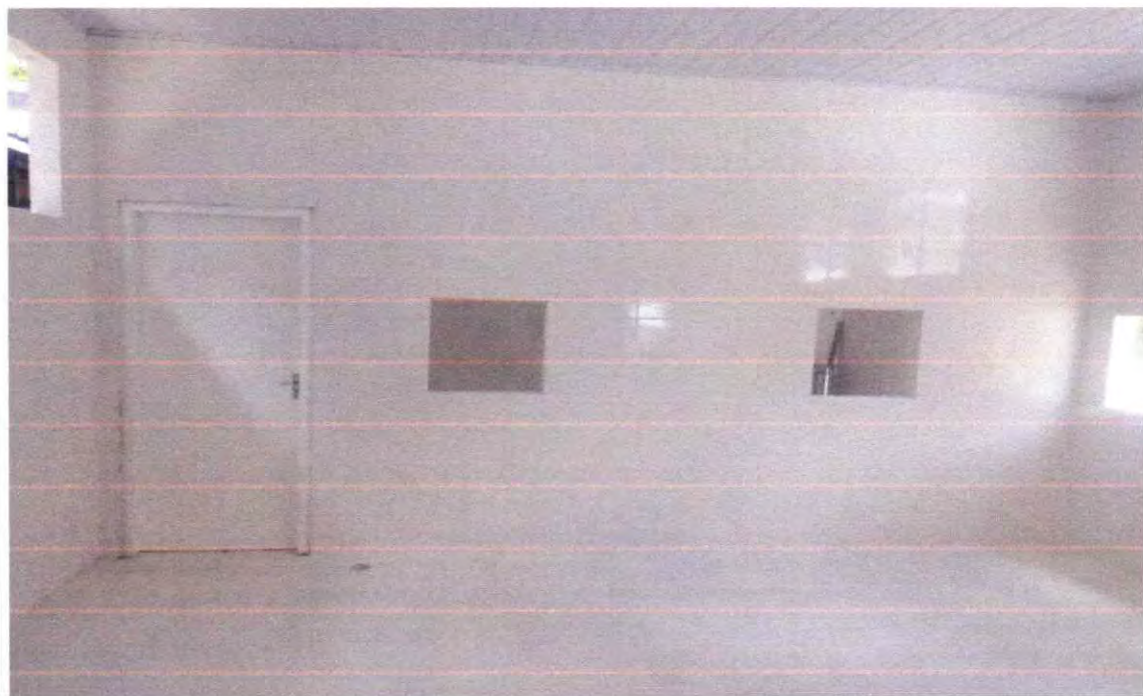


- Cobertura: Estrutura metálica, cobertura com telha trapezoidal;
- Esquadrias: Portas em madeira de 0,70, 0,80 e 0,90, porta em alumínio, basculante e cobogo em concreto;
- Pisos: Contrapiso em concreto, revestimento cerâmico, piso em concreto;
- Forro Pvc com estrutura de fixação;
- Pintura: Tinta Látex e tinta Esmalte;
- Instalações Hidrossanitárias: Lavatório, tubos, conexões, registros, Bacia sanitária, bancada em granito, caixa de concreto pré moldado, fossa séptica, reservatório de água, sumidouro, caixa de gordura;
- Instalações elétricas: Caixa de proteção, tubos eletrodutos e conexões, fios e cabos, aterramento, tomadas, interruptores, disjuntores, quadro de distribuição, luminárias.

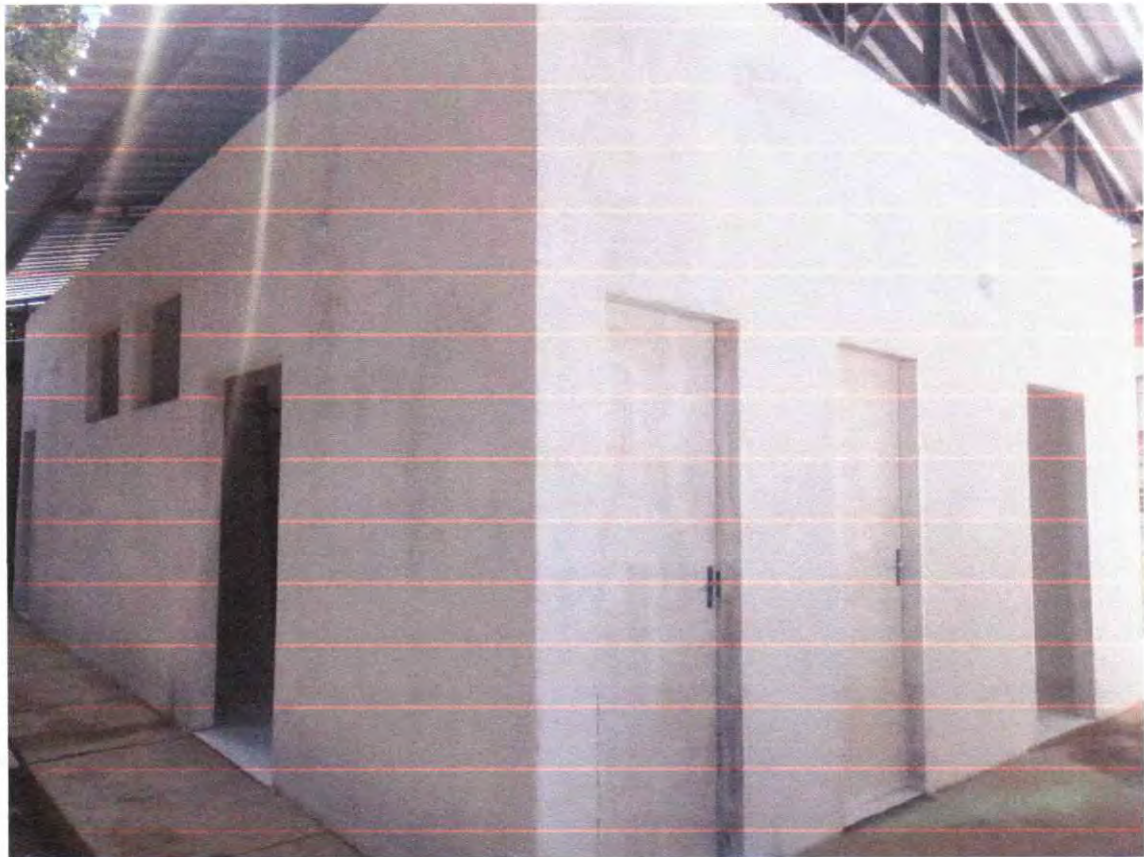

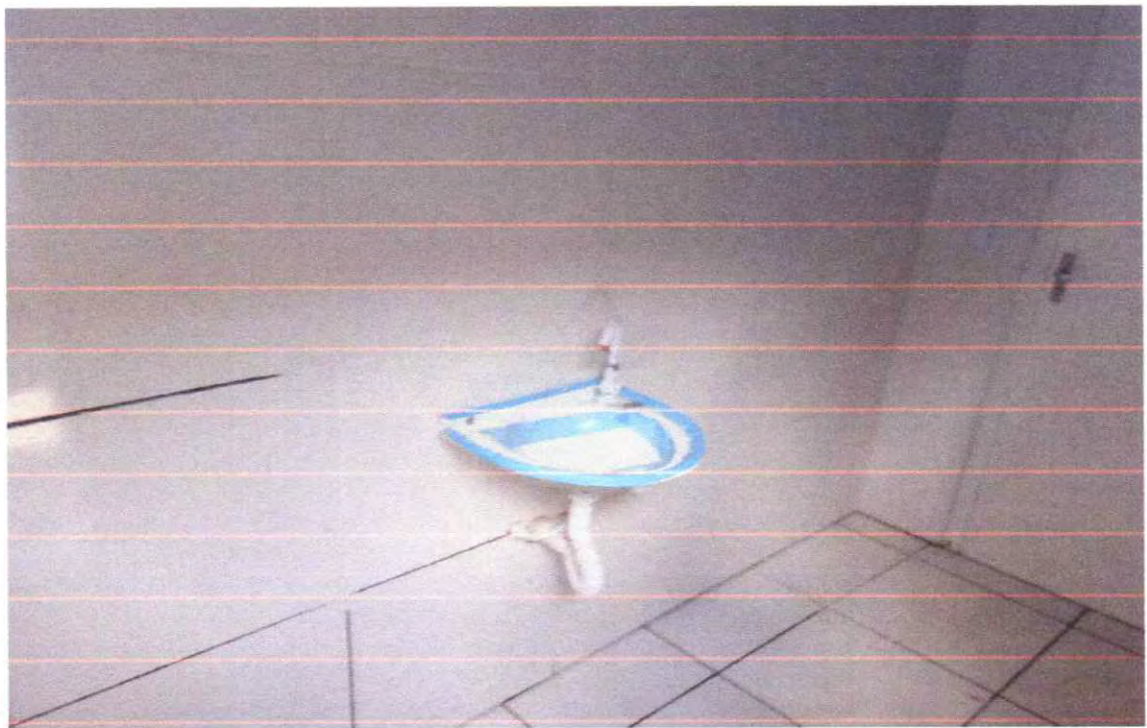



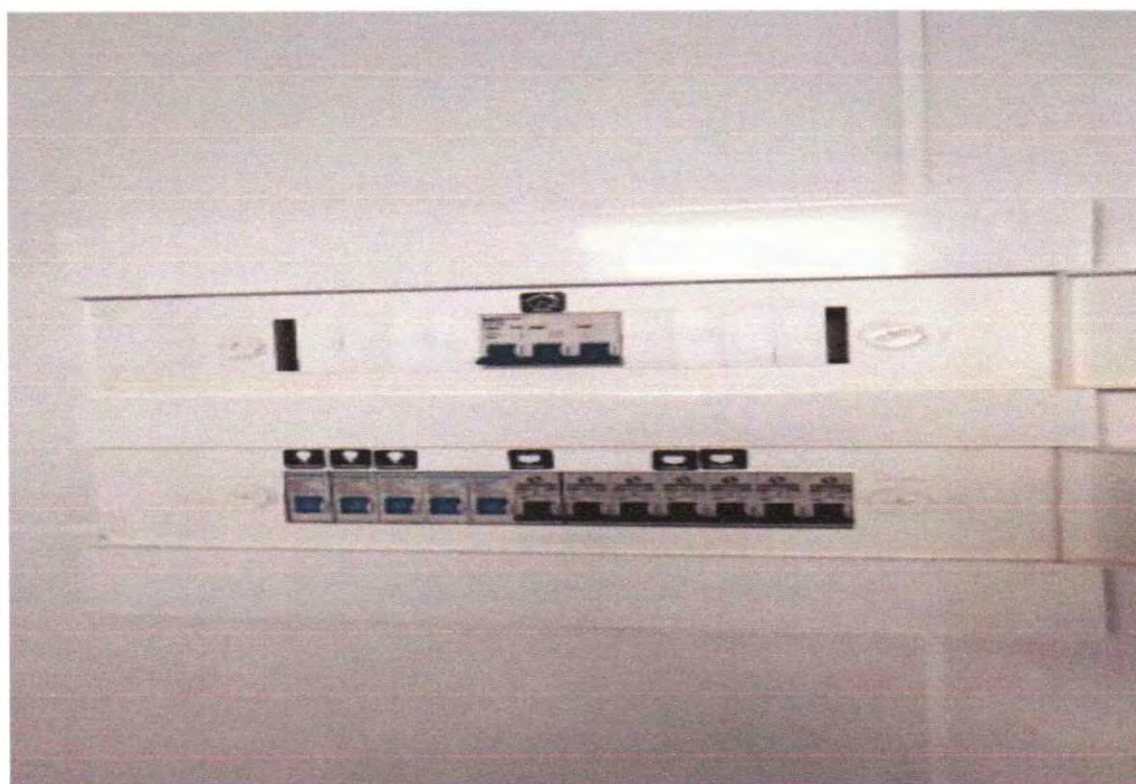



BA, 30 de Janeiro de 2020

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.


THAIS VEIRA DA COSTA
Responsável Técnica - Eng^a Civil.

BA, 30 de Janeiro de 2020

Declaro que o executor atuou sob minha orientação e, portanto ratifico a execução das atividades conforme descrito neste documento.


Adi Lira de Sousa
Coordenador Geral
ECOBÁHIA

BA, 30 de Janeiro de 2020

Declaro para os devidos fins de direito a veracidade das informações constantes neste documento.


CAJAZEIRA CONSTRUTORA LTDA
Edson Nunes da Silva P.p.
Cnpj: 07.516.788/0001-32



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

I

-

IDENTIFICAÇÃO:

SEI nº	021.2141.2020.0003418-11		Data de Entrada do Processo na SETRE		23/11/2020
Termo de Colaboração nº	013/2019	Valor do Termo de Colaboração R\$	638.840,85	Unidade Gestora	211010007 SESOL
Objeto	Implantação da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais de Economia Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável.				
Fonte	0331	Vigência	18/06/2019 a 18/06/2020	Prazo para prestação de contas	16/08/2020
Conveniente	Instituto Baiano de Desenvolvimento Ambiental e Sócio Produtivo - ECOBAHIA				
Responsável	Adi Lira de Sousa				
Endereço	Rua Sostenes Almeida, 27		CEP – 45.890-000		
Bairro	Centro	Cidade	Pau Brasil - BA		

II – DOCUMENTAÇÃO:

OBRIGATORIA (Lei nº 13.019/14)	PÁGINAS
• Cópia do Termo de Colaboração e Termos Aditivos se houver;	00024534718

• Cópia do Plano de Trabalho	00024534718
• Relatório de Execução Físico-Financeiro;	00024507070
• Demonstrativo Financeiro das Receitas e Despesas (ou Origens e Aplicações dos Recursos);	00024507070
• Relação de Pagamentos;	00024507070
• Extrato Bancário da Conta Específica do Termo de Colaboração/ Extrato Bancário da Aplicação Financeira	00024506830
• Conciliação Bancária, quando necessária;	00024507070
• Comprovação das despesas realizadas/Cotações de Preços;	00024506584 00024506733
• Contratos de Prestação de Serviços;	N/C
• Declaração da Contrapartida (Quando Houver)	N/C
• Parecer ou laudo técnico da unidade responsável pela supervisão do Termo de Colaboração, emitido por profissional habilitado, devidamente identificado;	AGUARDANDO

OUTROS DOCUMENTOS:	PÁGINAS
• Histórico de Pagamento (Ordem Bancária);	00024535624
• Relação de Bens Adquiridos;	00024507070
• Demonstrativo de Rendimentos;	00024507070
• Comprovante de recolhimento do saldo de recursos;	00024506830
• Declaração de guarda e conservação dos documentos contábeis;	00024507070
• Relatório de Atividades (se houver do Convenente)	00024507223

III – ASPECTO FINANCEIRO:

	VALOR R\$
--	-----------

RECURSOS	
• Valor do Termo de Colaboração	638.840,85
• Termo Aditivo (quando for de valor)	N/C
• Valor da Contrapartida (quando previsto no plano de trabalho) (A)	-
• Valor Liberado (B)	232.768,17
• Aplicação Financeira (C)	604,05
• Valor a comprovar (D=A+B+C)	233.372,22
• Valor Comprovado	233.372,22
• Tarifas Bancárias	-
• Saldo a Devolver ou Comprovar	0,00

* PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) TOTAL () PARCIAL - 1ª Parcela

IV – CONCLUSÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA:

- As solicitações contidas no Ofício de diligência 048 de 2020 foram atendidas conforme documento nº 00025800213 do Processo SEI Nº 021.2141.2020.0003418-11. Sendo assim, concluímos que a prestação de contas final encontra-se REGULAR.

V – DADOS DO ANALISTA:

Nome: Carla Sant'Anna

Matrícula: 21.619.949-5



Documento assinado eletronicamente por **Carla Cristiane Gomes Santanna, Técnico Nível Médio**, em 21/12/2020, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Dairson Marcilio Oliveira Carneiro, Coordenador II**, em 21/12/2020, às 17:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **00025801245** e o código CRC **20BCBA53**.

Referência: Processo nº 021.2141.2020.0003418-11

SEI nº 00025801245
